

Summary of the Construction Progress  
As of 26 October, 2018

Construction Period	2,382 Days
Work Period	1,967 Days
Remaining Period	415 Days
Planned Work	55.78 %
Current Work	53.76 %
Construction Delay	- %



**สรุปผลการดำเนินการงานก่อสร้าง**

**ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2561**

<b>ระยะเวลาก่อสร้าง</b>	<b>2382</b>	<b>วัน</b>
<b>ระยะเวลาทำงาน</b>	<b>1967</b>	<b>วัน</b>
<b>ระยะเวลาดังเหลือ</b>	<b>415</b>	<b>วัน</b>
<b>แผนงานสะสมที่ตั้งไว้</b>	<b>55.78</b>	<b>%</b>
<b>ผลงานสะสมที่ทำได้</b>	<b>53.76</b>	<b>%</b>
<b>ผลงานช้ากว่าแผน</b>	<b>-</b>	<b>%</b>

Source: Thai Parliament website (<https://www.parliament.go.th>).



Source: The Official Facebook Page on the New Parliament Construction Project

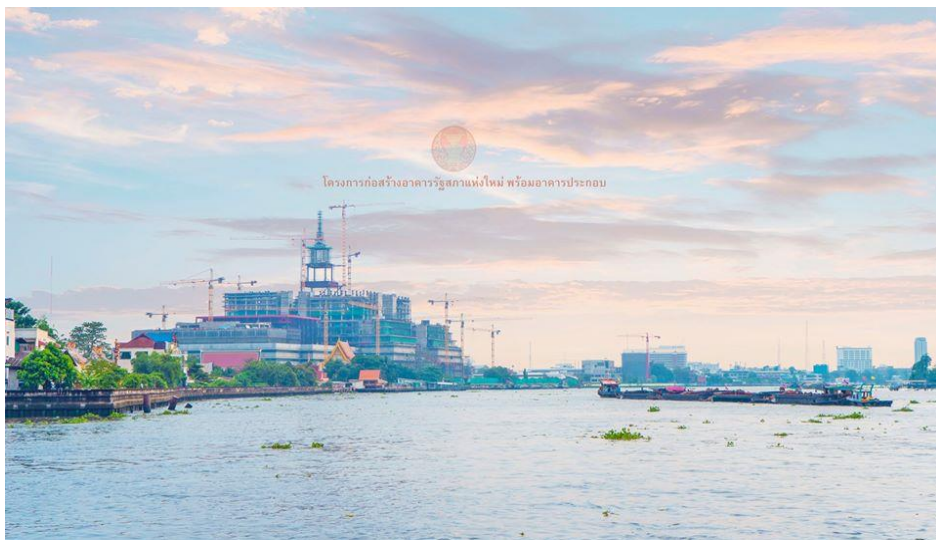


Photo: New Parliamentary Construction Project view from Chao Phraya riverside
